


Månedsrapport

Start år: 2021
Forventet afsluttet år: 2025

Status på SONFOR Varme

Opfølgnings-
grundlag

Projekt: Nordals Fjernvarme	Revideret budget 5.0	Revideret budget 6.0	Total real. Pr. 12.01.24	Afvigelse	Forventet real. pr. 12.12.23	Forventet real. afvig.
Transmissionsledninger og pumpecentraler						
Total Fase 1 Nordborg/Havnbjerg (Afsluttet)	50.017.961	50.017.961	50.157.793	-139.832	50.157.793	-139.832
Fase 2 (Svenstrup, Guderup, Egen):						
Total Fase 2	44.442.547	48.611.844	50.316.550	-1.704.706	52.039.731	-3.427.887
Transmissionsnet i alt	94.460.508	98.629.805	100.474.343	-1.844.538	102.197.525	-3.567.719
Distributionsnet - gadeledninger						
Fase 1:						
Gadeledninger - afsluttede projekter	83.276.545	83.276.545	83.880.047	-603.501	85.903.146	-2.626.601
Gadeledninger - igangværende projekter	34.854.090	38.419.832	24.359.475	10.973.221	38.419.832	0
Total Fase 1	118.130.576	121.696.377	108.239.521	10.369.720	124.322.979	-2.626.601
Fase 2						
Total Fase 2	112.436.808	131.143.789	44.044.140	79.679.366	131.194.334	-50.545
Distributionsnet i alt	230.567.384	252.840.167	152.283.661	90.049.086	255.517.313	-2.677.146
Distributionsnet + Transmissionsnet	325.027.892	351.469.972	252.758.005	88.204.548	357.714.837	-6.244.865
Stikledninger						
Stikledninger - afsluttede projekter	4.285.519	4.285.519	8.602.749	-4.317.230	2.833.474	1.452.045
Stikledninger - igangværende projekter	49.916.126	49.112.616	94.229.939	-45.117.323	49.112.616	0
Produktionskapacitet						
Produktionskapacitet, 6 MW	45.990.000	45.990.000		45.990.000	45.990.000	0
Finansieringsomkostninger	919.800	919.800		919.800	919.800	0
Projekt Nordals Fjernvarme - i alt	426.139.337	451.777.907	355.590.692	84.759.995	455.650.928	-4.792.821

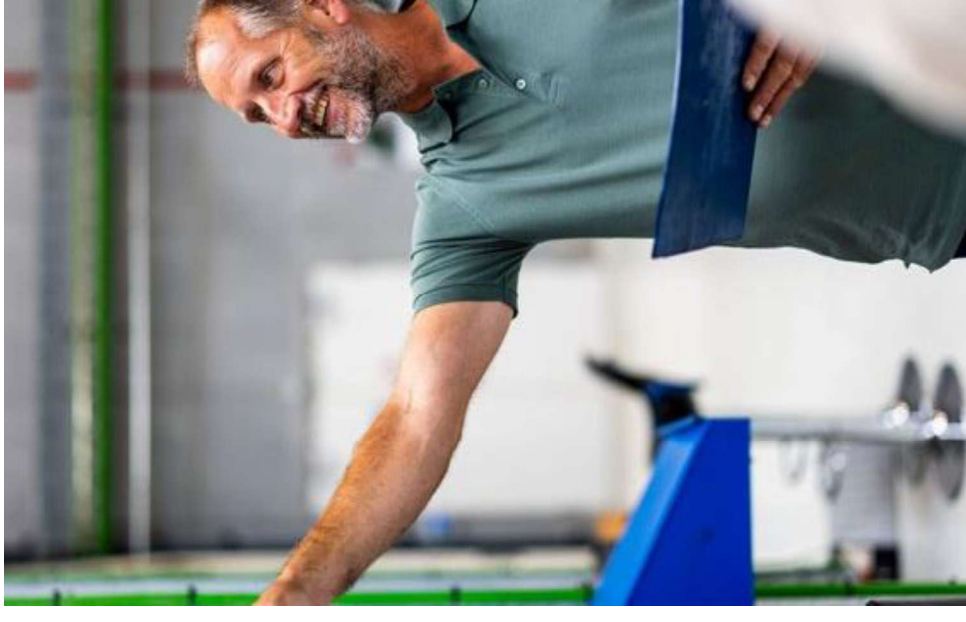

SONFOR
