


Månedrapport

Start år: 2021
Forventet afsluttet år: 2025

Status på SONFOR Varme

Projekt: Nordals Fjernvarme	Opfølgings- grundlag		Total real. Pr. 07.03.2024	Afvigelse	Forventet real. pr. 12.12.23	Forventet real. afvig. 12.12.23
	Revideret budget 5.0	Revideret budget 6.0				
Halmværk incl. varmeveksler (Afsluttet)	78.307.122	78.307.122	78.307.122	0	78.307.122	0
Transmissionsledninger og pumpecentraler						
Total Fase 1 Nordborg/Havnbjerg (Afsluttet)	50.017.961	50.017.961	50.157.793	-139.832	50.157.793	-139.832
Total Fase 2 (Svenstrup, Guderup, Egen) Afsluttet	44.442.547	48.611.844	50.558.497	-1.946.652	52.008.323	-3.396.479
Transmissionsnet i alt	94.460.508	98.629.805	100.716.290	-2.086.484	102.166.116	-3.536.311
Distributionsnet - gadeledninger						
Fase 1:						
Gadeledninger - afsluttede projekter	83.276.545	83.276.545	83.880.047	-603.501	85.903.146	-2.626.601
Gadeledninger - igangværende projekter	34.854.030	38.419.832	24.961.714	10.403.182	38.419.832	0
Total Fase 1	118.130.576	121.696.377	108.841.761	9.799.680	124.322.979	-2.626.601
Fase 2						
Total Fase 2	112.436.808	131.143.789	51.391.139	71.798.781	131.194.334	-50.545
Distributionsnet i alt	230.567.384	252.840.167	160.232.900	81.598.461	255.517.313	-2.677.146
Distributionsnet + Transmissionsnet	325.027.892	351.469.972	260.949.190	79.511.977	357.683.429	-6.213.457
Stikledninger						
Stikledninger - afsluttede projekter	4.285.519	4.285.519	8.602.749	-4.317.230	2.833.474	1.452.045
Stikledninger - igangværende projekter	49.916.126	49.112.616	99.754.896	-50.642.280	49.112.616	0
Produktionskapacitet						
Produktionskapacitet, 6 MW	45.990.000	45.990.000		45.990.000	45.990.000	0
Finansieringsomkostninger	919.800	919.800		919.800	919.800	0
Projekt Nordals Fjernvarme - i alt	504.446.459	530.085.029	447.613.957	71.462.267	534.846.441	-4.761.412

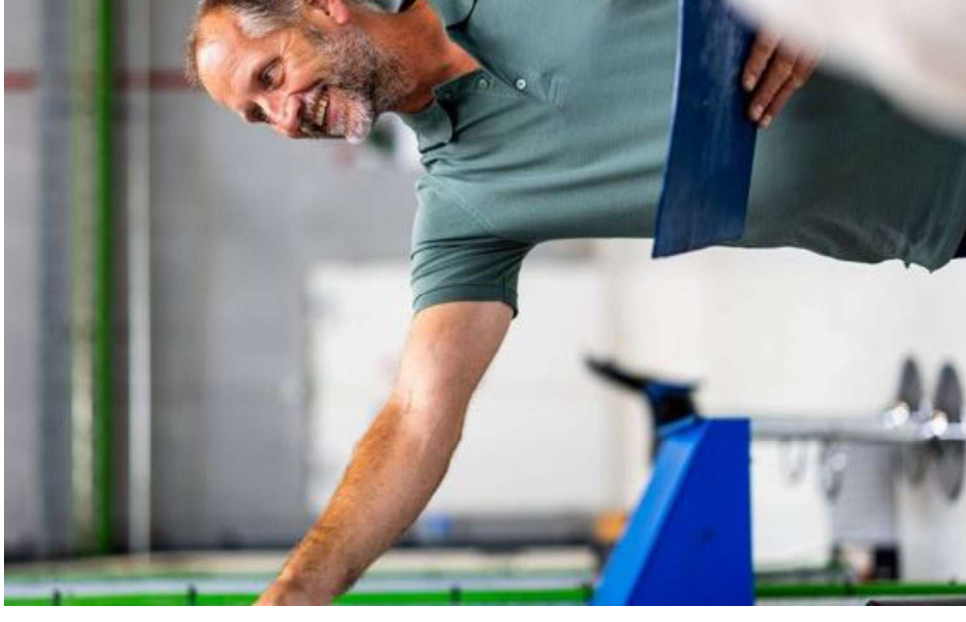

SONFOR
