


## Månedrapport

Start år: 2021  
Forventet afsluttet år: 2025

# Status på SONFOR Varme

Projekt: Nordals Fjernvarme	Opfølgnings-		Total real. Pr.	Afvigelse	Forventet real. pr. 12.12.23	Forventet real. afvig.
	Revideret budget 5.0	Revideret budget 6.0				
<b>Halmværk incl. varmeveksler (Afsluttet)</b>	78.307.122	78.307.122	78.307.122	0	78.307.122	0
<b>Transmissionsledninger og pumpecentraler</b>						
Total Fase 1 Nordborg/Havnbjerg (Afsluttet)	50.017.961	50.017.961	50.157.793	-139.832	50.157.793	-139.832
Total Fase 2 (Svenstrup, Guderup, Egen):	44.442.547	48.611.844	50.430.576	-1.818.732	52.055.905	-3.444.061
<b>Transmissionsnet i alt</b>	94.460.508	98.629.805	100.588.369	-1.958.564	102.213.698	-3.583.893
<b>Distributionsnet - gadeledninger</b>						
<b>Fase 1:</b>						
Gadeledninger - afsluttede projekter	83.276.545	83.276.545	83.880.047	-603.501	85.903.146	-2.626.601
Gadeledninger - igangværende projekter	34.854.090	38.419.832	25.041.207	10.323.689	38.419.832	0
Total Fase 1	118.130.576	121.696.377	108.921.254	9.720.188	124.322.979	-2.626.601
<b>Fase 2</b>						
Total Fase 2	112.436.808	131.143.789	49.385.756	73.757.725	131.194.334	-50.545
<b>Distributionsnet i alt</b>	230.567.384	252.840.167	158.307.010	83.477.912	255.517.313	-2.677.146
<b>Distributionsnet + Transmissionsnet</b>	325.027.892	351.469.972	258.895.379	81.519.349	357.731.011	-6.261.039
<b>Stikledninger</b>						
Stikledninger - afsluttede projekter	4.285.519	4.285.519	8.602.749	-4.317.230	2.833.474	1.452.045
Stikledninger - igangværende projekter	49.916.126	49.112.616	97.987.984	-48.875.368	49.112.616	0
<b>Produktionskapacitet</b>						
Produktionskapacitet, 6 MW	45.990.000	45.990.000		45.990.000	45.990.000	0
Finansieringsomkostninger	919.800	919.800		919.800	919.800	0
<b>Projekt Nordals Fjernvarme - i alt</b>	504.446.459	530.085.029	443.793.235	75.236.550	534.894.023	-4.808.994

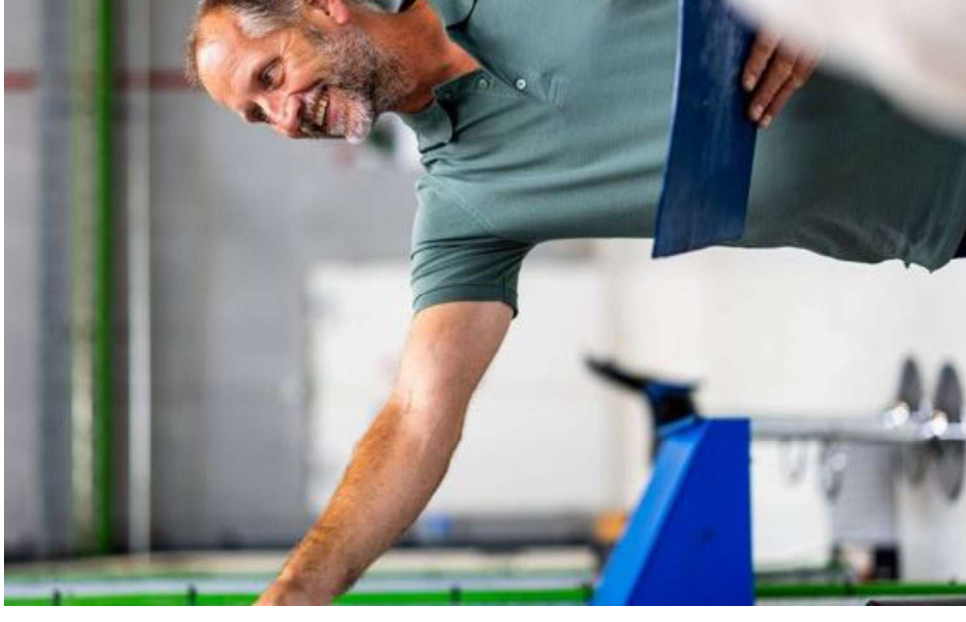

SONFOR
