


Månedsrapport

Start år: 2021
Forventet afsluttet år: 2025

Status på SONFOR Varme

	Opfølgingsgrundlag		Afvigelse: Rev.bud ctr. Total real.		Afvigelse: Rev.bud ctr. Forv. real.	
	Revideret budget 5.0	Revideret budget 6.0	Total realiseret	Rev.budget - Total realiseret	Forventet realiseret	Rev.budget - Forventet realiseret
Projekt: Nordals Fjernvarme	78.307.122	78.307.122	78.307.122	0	78.307.122	0
Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)						
Transmissionsledninger og pumpecentraler						
Total Fase 1 Nordborg/Havnbjerg (Afsluttet)	50.017.961	50.017.961	50.157.793	-139.832	50.157.793	-139.832
Total Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (Afsluttet)	44.442.547	48.611.844	50.558.497	-1.946.653	52.008.323	-3.396.479
Transmissionsnet i alt	94.460.508	98.629.805	100.716.290	-2.086.485	102.166.116	-3.536.311
Distributionsnet - gadeledninger						
Fase 1:						
Gadeledninger - afsluttede projekter	83.276.545	83.276.545	102.912.073	-19.635.528	85.903.146	-2.626.601
Gadeledninger - igangværende projekter	34.854.030	38.419.832	14.004.177	24.415.655	38.419.832	0
Total Fase 1	118.130.575	121.696.377	116.916.250	4.780.127	124.322.978	-2.626.601
Fase 2:						
Gadeledninger - afsluttede projekter			8.715.966			
Gadeledninger - igangværende projekter	112.436.808	131.143.789	59.090.571	63.337.253	131.194.334	-50.545
Distributionsnet i alt	230.567.383	252.840.166	184.722.786	68.117.380	255.517.312	-2.677.146
Transmissionsnet + Distributionsnet	325.027.891	351.469.971	285.439.076	66.030.895	357.683.428	-6.213.457
Stikledninger						
Stikledninger - afsluttede projekter	4.285.519	4.285.519	106.803.156	-102.517.637	2.833.474	1.452.045
Stikledninger - igangværende projekter	49.916.126	49.112.616	33.386.592	15.726.024	49.112.616	0
Produktionskapacitet						
Produktionskapacitet, 6 MWh	45.990.000	45.990.000	775.195	45.214.805	45.990.000	0
Finansieringsomkostninger	919.800	919.800	919.800	0	919.800	0
Projekt Nordals Fjernvarme - i alt	504.446.458	530.085.028	504.711.141	25.373.887	534.846.440	-4.761.412

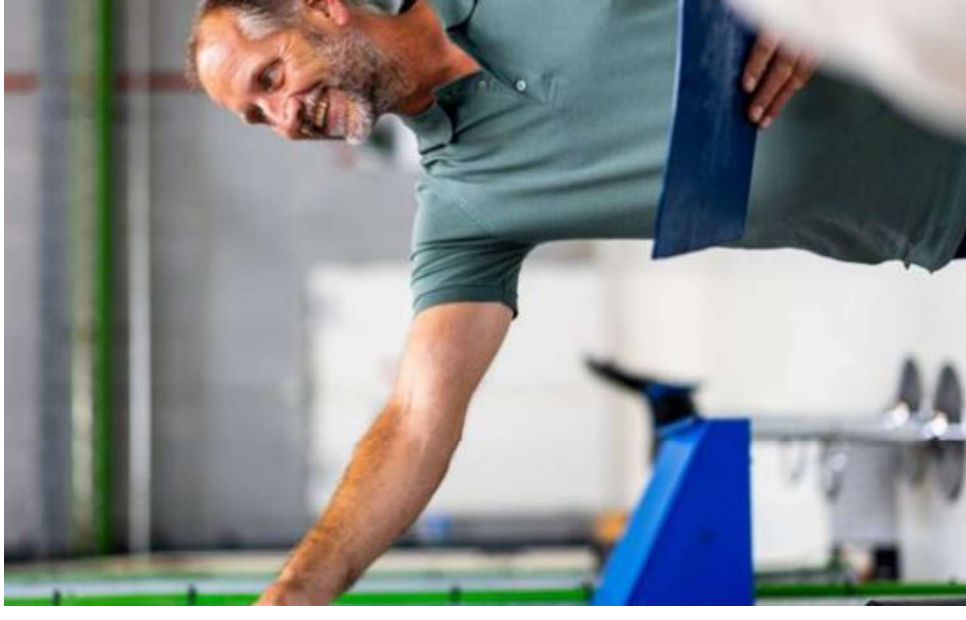

SONFOR
