


## Månedsrapport

Start år: 2021  
Forventet afsluttet år: 2025

# Status på SONFOR Varme

Projekt: Nordals Fjernvarme	Opfølgingsgrundlag		Atv. Rev. bud ctr. Total real.		Atv. Rev. bud ctr. Forv. real.	
	Revideret budget 5.0	Revideret budget 6.0	Total realiseret	Rev. budget - Total realiseret	Forventet realiseret	Rev. budget - Forventet realiseret
Halmværk incl. varmeveksler (afsluttet)	78.307.122	78.307.122	82.332.196	-4.025.074	82.332.196	-4.025.074
<b>Transmissionsledninger og pumpecentraler</b>						
Total Fase 1 Nordborg/Havnbjerg (Afsluttet)	50.017.961	50.017.961	50.387.559	-369.598	50.387.559	-369.598
Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (Afsluttet)	44.442.547	48.611.844	50.786.607	-2.174.763	50.786.607	-2.174.763
Fase 2 Svenstrup, Guderup, Egen (åben)	0	0	0	0	0	0
<b>Transmissionsnet i alt</b>	<b>94.460.508</b>	<b>98.629.805</b>	<b>101.174.166</b>	<b>-2.544.361</b>	<b>101.174.166</b>	<b>-2.544.361</b>
<b>Distributionsnet - gadeledninger</b>						
<b>Fase 1:</b>						
Gadeledninger - afsluttede projekter	118.130.575	121.696.377	108.841.761	12.854.616	108.841.761	12.854.616
Gadeledninger - igangværende projekter	0	0	0	0	0	0
<b>Total Fase 1</b>	<b>118.130.575</b>	<b>121.696.377</b>	<b>108.841.761</b>	<b>12.854.616</b>	<b>108.841.761</b>	<b>12.854.616</b>
<b>Fase 2:</b>						
Gadeledninger - afsluttede projekter			69.078.369			
Gadeledninger - igangværende projekter	112.436.808	131.143.789	103.047.382	28.096.407	131.143.789	0
<b>Total Fase 2</b>	<b>230.567.383</b>	<b>252.840.166</b>	<b>211.889.143</b>	<b>40.951.023</b>	<b>239.985.550</b>	<b>12.854.616</b>
<b>Distributionsnet i alt</b>	<b>325.027.891</b>	<b>351.469.971</b>	<b>313.063.308</b>	<b>38.406.663</b>	<b>341.159.716</b>	<b>10.310.255</b>
<b>Transmissionsnet + Distributionsnet</b>						
<b>Stikledninger</b>						
Stikledninger - afsluttede projekter	4.285.519	4.285.519	143.893.978	-139.608.459	10.517.647	-6.232.128
Stikledninger - igangværende projekter	49.916.126	49.112.616	7.474.741	41.637.875	49.112.616	0
Tilslutningsbidrag og Varme unit			-85.241.100	85.241.100	0	0
Kommunale tilslutninger			-5.423.605	5.423.605	0	0
<b>Stikledninger</b>	<b>54.201.645</b>	<b>53.398.135</b>	<b>60.704.014</b>	<b>-7.305.879</b>	<b>59.630.263</b>	<b>-6.232.128</b>
<b>Produktionskapacitet</b>						
Produktionskapacitet, 6 MWh	45.990.000	45.990.000	0	45.990.000	45.990.000	0
Finansieringsomkostninger	919.800	919.800	936.718	-16.918	936.718	-16.918
<b>Projekt Nordals Fjernvarme - i alt</b>	<b>504.446.458</b>	<b>530.085.028</b>	<b>457.036.237</b>	<b>-17.615.913</b>	<b>530.048.893</b>	<b>36.135</b>

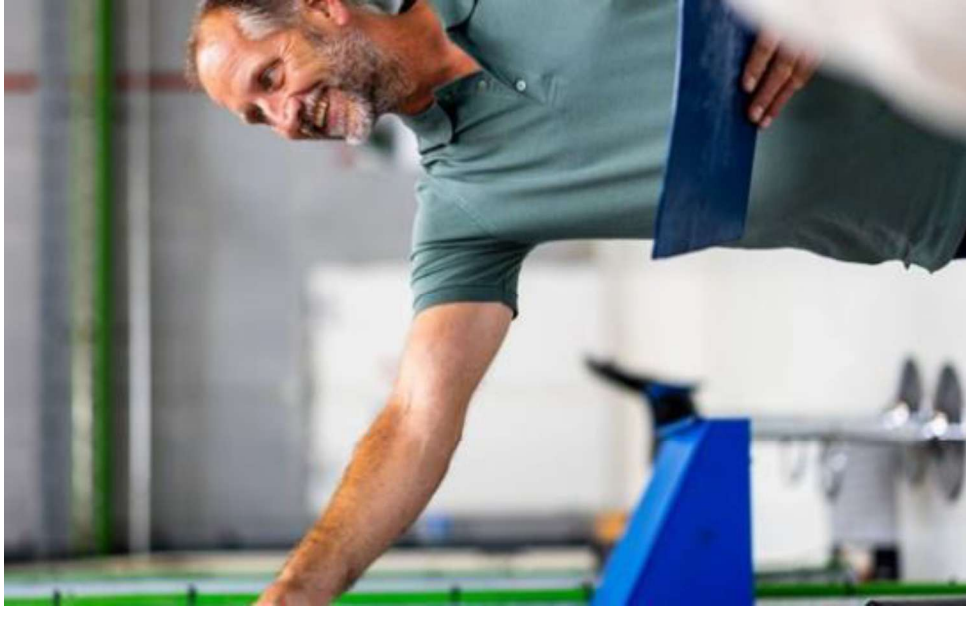

SONFOR
